

ToolBox :

Méthode & Outils BE

Statut du document	Version	Commentaires	Réalisé par	Vérifié par
	02		DAVAN Domitille	
C	01		DAVAN Domitille	DE ROLAND Daniel



SOMMAIRE

1. Normalisation au sein du BE.....	2
a. Normalisation documentaire.....	2
b. Normalisation du Drive.....	2
2. Outils BE.....	4
a. Notion.....	4
b. Questionnaire Météo.....	9
c. KPis.....	9
d. Référentiel PSE.....	11
e. Adoption des outils.....	11
3. La Méthode.....	12
a. Daily.....	12
b. Weekly.....	12



1. Normalisation au sein du BE

Il est important que tout le BE soit sur la même base, à la fois pour le partage inter-projets mais aussi pour la transmission et aussi pour la recherche de documents par le chef de projet. Pour cela une normalisation à été mise en place.

a. Normalisation documentaire

Pour plus de détail se référer au document "2603_GDP_DI_Normalisation_des_documents_v01", qui détaille la marche à suivre.

Il est important que cette normalisation soit mise en place au plus rapidement lors du lancement des projets, sinon il y a un risque de prendre l'habitude de ne pas nommer les documents et de suivre la procédure ce qui résulterait à une non adoption de cette méthode.

Cette normalisation documentaire ne fonctionne pas pour tous les projets (tous projets avec livrables non conventionnels)


b. Normalisation du Drive

Concernant le drive tous les drive de chaque projet doit se composer d ela manière suivante :

1. *Projet (Chaque projet peut ensuite organiser comme il souhaite à l'intérieur de projet)*
2. *Ecole*
 - a. *Revue de Lancement*
 - b. *Revue de Mi-Projet*
 - c. *Soutenance Finale*
3. *Echange*

A la fin du MSI tout reste sur le drive pour la passation, sauf le point 3 qui devra être vidé à chaque fin de projet. L'intérêt du point 3 est de déposer les docs entre personnes du même projet de façon non officielle, ou bien avant de déposer officiellement. A chaque fin de projet il faut donc bien vérifier que ce dossier est vide et que s' il y a encore des documents dessus il sont bien déposés au bon endroit.

exemple avec drive Gestion de Projet :

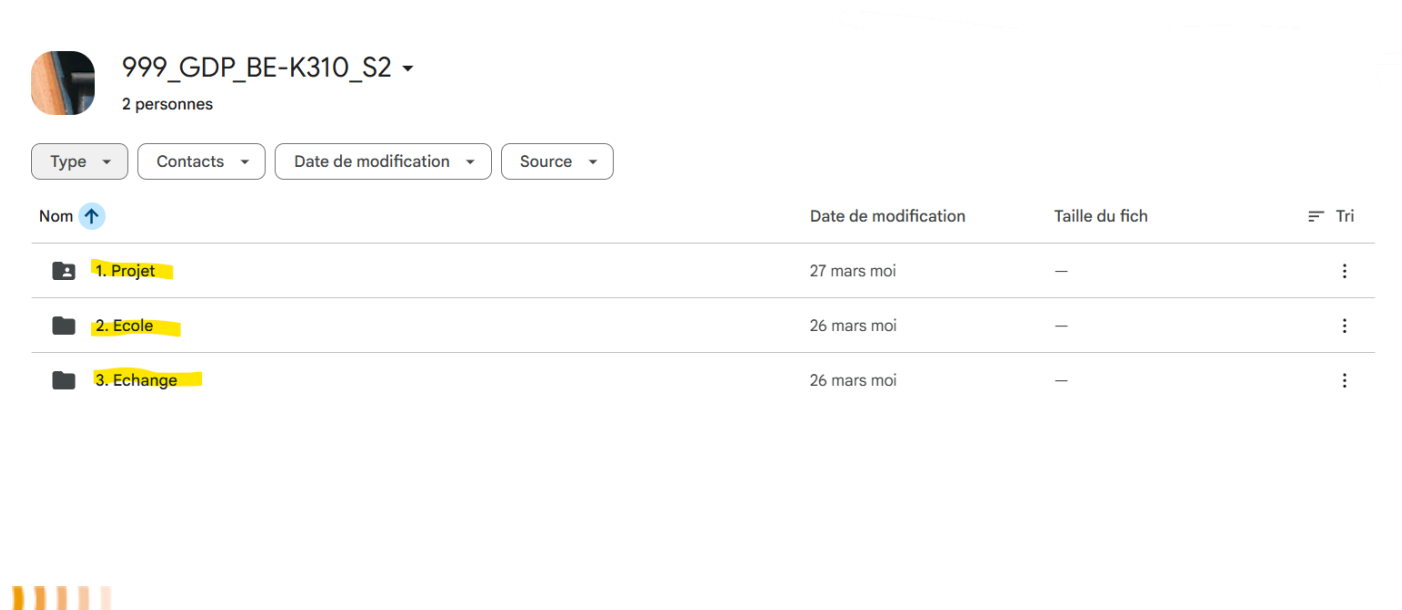

Nom	Date de modification	Taille du fich	Tri
1. Projet	27 mars moi	—	⋮
2. Ecole	26 mars moi	—	⋮
3. Echange	26 mars moi	—	⋮

999_GDP_BE-K310_S2 > 1. Projet ▾

Type ▾ Contacts ▾ Date de modification ▾ Source ▾

Nom ↑	Date de modification	Taille du fich	Tri
1.1 Questionnaires	27 mars moi	—	⋮
1.2 Evolution des compétences	27 mars moi	—	⋮
1.3 Formations	10 avr. moi	—	⋮
1.4 Conception	15 avr. moi	—	⋮
1.5 Méthodes & Outils	15 avr. moi	—	⋮

999_GDP_BE-K310_S2 > 2. Ecole ▾

Type ▾ Contacts ▾ Date de modification ▾ Source ▾

Nom ↑	Date de modification	Taille du fich	Tri
2.1 Revue de Lancement	26 mars moi	—	⋮
2.2 Revue de Mi projet	26 mars moi	—	⋮
2.3 Revue Soutenance Finale	26 mars moi	—	⋮

999_GDP_BE-K310_S2 > 2. Ecole > 2.1 Revue de Lancement ▾

Type ▾ Contacts ▾ Date de modification ▾ Source ▾

Nom ↑	Date de modification	Taille du fich	Tri
2603_GDP_CDC_v01	15 avr. moi	1,1 Mo	⋮
261004_DI_GDP_Revue de Lancement	09:49 moi	559 Ko	⋮



2. Outils BE

Les outils proposés ci-dessous sont à utiliser en fonction des projets, selon leurs intérêts et utilités. Excepté l'outil Notion qui permet de centraliser les projets et leur donner une base commune normalisée.


a. Notion

Il est conseillé pour une utilisation plus simple de notion de passer par Chrome et d'utiliser l'extension capture to Notion.

Utilisation de capture to Notion :

Télécharger l'extension via le lien ci-dessous et se connecter avec les identifiants/mot de passe utiliser pour se connecter à notion.

https://chromewebstore.google.com/detail/ldmmifpegiqmeammaeckplhnjbbpccmm?utm_source=item-share-cb

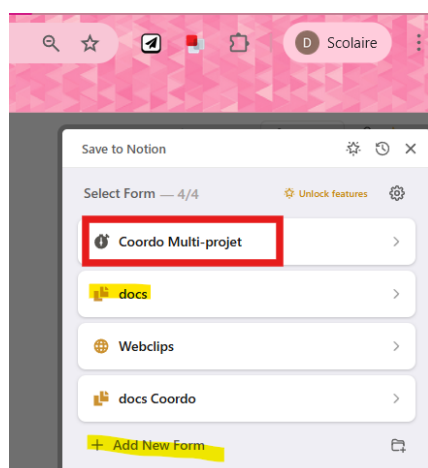

Cliquez sur add a new form pour ajoutez un nouveau lien automatique. Attention vous ne pourrez créer que 4 form. Une fois crée vous ne pouvez ni modifier ni supprimer.


Outil mis en place par le Chef de Projet (Daniel de Roland). Il permet d'avoir à tous les projets la même base et au chef de projet et au coordinateur / coordinatrice de pouvoir voir et suivre chaque projet facilement.

Si les étudiants du BE ne sont pas familiarisés avec l'outil il faudra alors leur réaliser une mini formation du fonctionnement.

Il comporte pour l'instant deux "vues" le Gantt de chaque projet, et la vue livrable de chaque projet.

Le Notion se présente de cette manière ci :



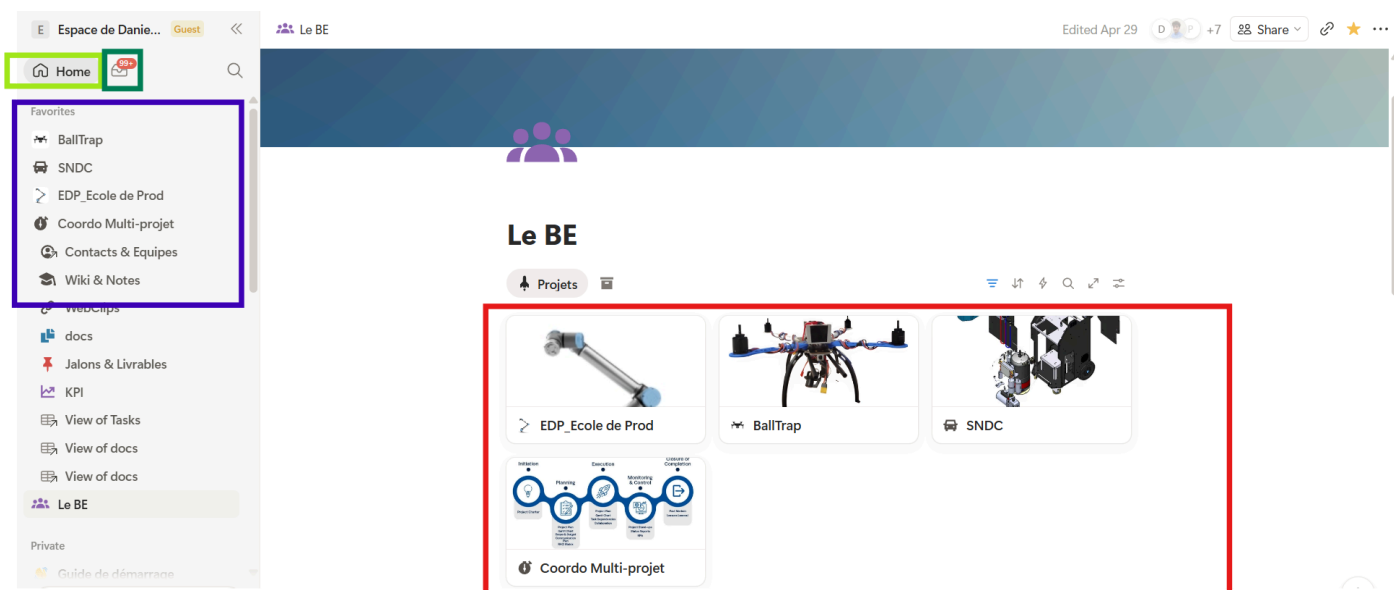

Dans le cadre rouge les différents projets.


Dans le cadre bleu les pages mises en favori, elles permettent de pouvoir accéder à ces pages rapidement sans repasser par le menu Home à chaque fois.

Le cadre vert clair est le menu Home, il permet de revenir à la page principale (Le BE).

Le cadre vert foncé est là où sont stockées les notifications, et où on voit les commentaires de tâches sur lesquels on a été tagués.


Vue Gantt :

Les projets sont découpés par phase, on prendra pour exemple le projet SNDC. Les phases en vert sont les phases terminées (toutes les sous phases sont finies). Celles en orange sont celles en cours et en grises celles à venir (pas encore commencées).

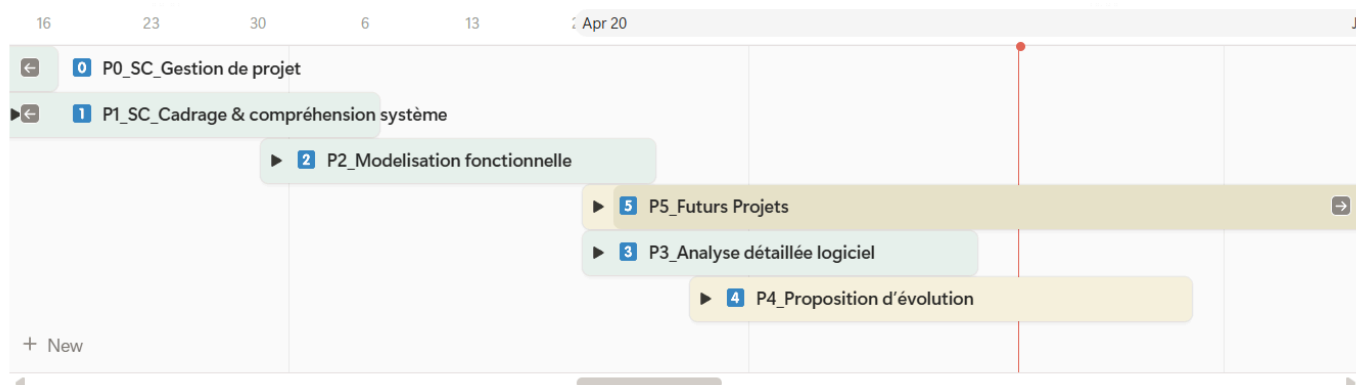

Les sous-phases se présentent comme ci-dessous. Chaque sous-tâche fait référence à un livrable, pour que le document apparaisse il faut le lier à la tâche à l'aide de l'outil capture to Notion (sinon copier/coller du lien).



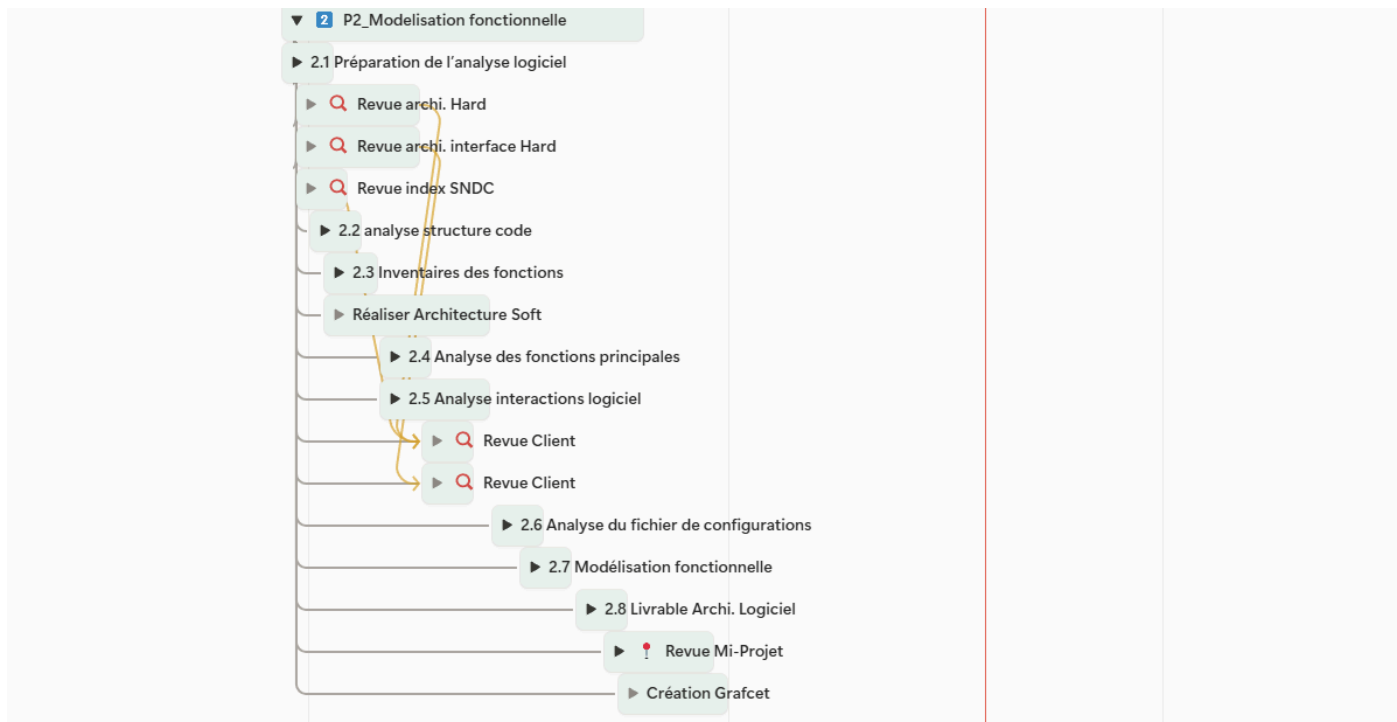

Pour que les documents liés aux tâches apparaissent dans la vue livrable il faut lier le document en cliquant dans la tâche et en allant dans l'onglet document



Revue Mi-Projet

type

Jalon !

Due Date

April 22, 2026 → April 29, 2026

Status

Done

Categorie

Doc

Properties

Priority

Elevé

Projects

SNDC

Assigned to

A Adrien  Marco FAUCHER

contacts

Empty

docs

Affiche Projet SNDC v1  SNDC April 3, 2026 12:00 AM

Major Task

2 P2_Modelisation fonctionnelle  SNDC

Done Date

April 30, 2026

Sub-Tasks

Diaporama Mi-Projet ● To do

Bilan Financier ● To do

Mettre à jour Analyse des risques ● To do

Bilan des interactions ● To do

New page ● To do

Progress


0.00% 

16 more properties

Il faut remplir le due date (date de début et fin de la tâche), la done date (date de fin, quand la tâche est terminée). Il faut penser à actualiser le statut en fonction de l'état de la tâche (à faire, en cours, terminé, obsolète quand tâche abandonnée car plus utile au projet ou bien bloqué si tâche ne peut pas être réalisé pour retard planning ou autre).



Lorsqu'une tâche est liée dans les doc de la tâche elle se mettra automatiquement dans la vue livrable. Étant donné qu'elle n'a pas de date de fin automatiquement elle se mettra en bas de la vue par défaut. Il faudra cliquer sur la tâche et remplir la date pour qu'elle se mette bien dans la vue livrable.

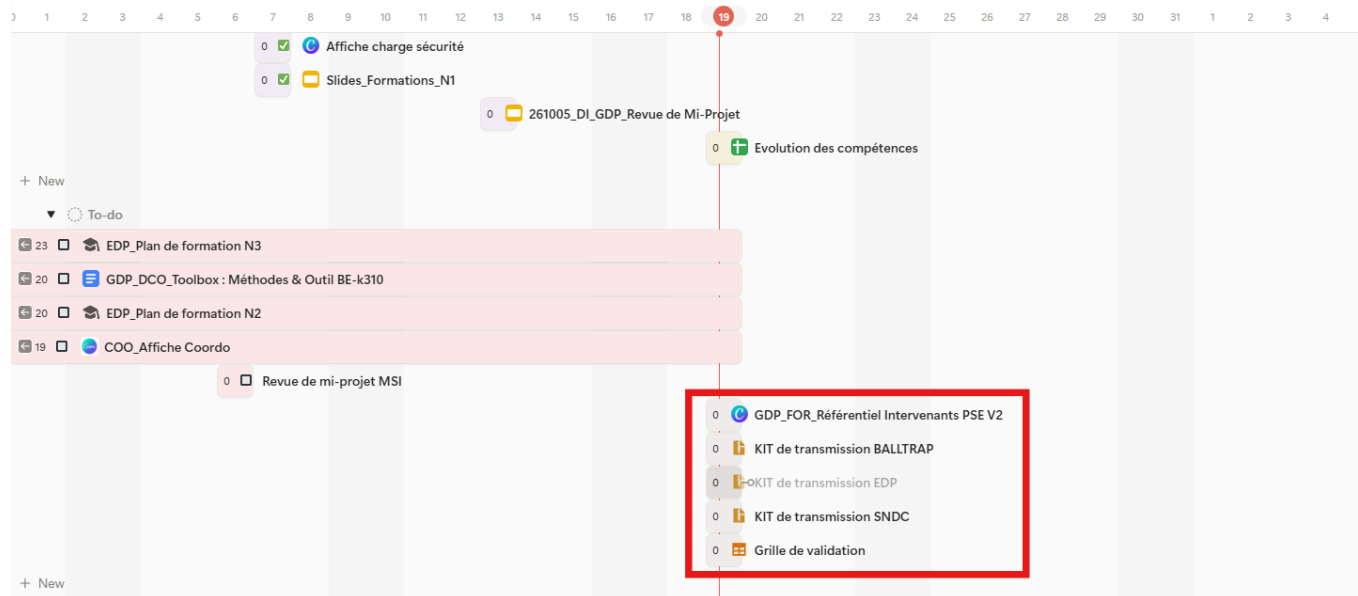

KIT de transmission BALLTRAP

Project Due Date done date status
 Coordo Multi-projet Empty Empty Pas commencé

Properties

URL Empty
 Fichiers et médias Empty
 Description Empty
 Affected to Empty
 Shared Empty
 destination Empty
 type Empty
 docs Empty


13 more properties

Comments

Ensuite comme pour le gantt, lorsque les tâches sont en vert c'est qu'elles sont terminées, en gris à faire



et en orange en cours.

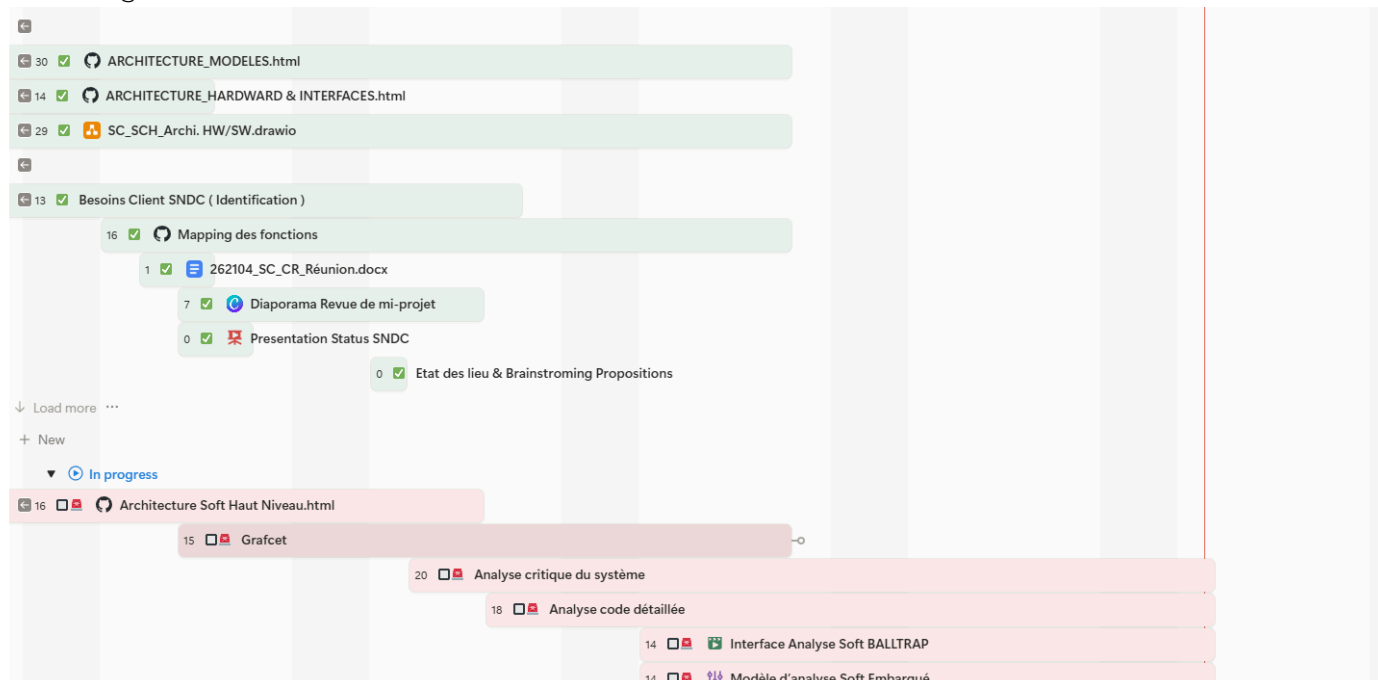

La longueur des livrables correspond au nombre de jours en retard (jours aussi sur le côté).

b. Questionnaire Météo

Le questionnaire météo est important car il permet d'ouvrir le dialogue avec les élèves pour faire remonter des informations, de voir comment chaque élève voit son projet et son avancement. Il faut l'adapter chaque semaine et tourner les questions de manière à voir les résultats les plus exploitables possible.

Pour voir des exemples de questionnaire, ils sont disponibles dans le drive 999_GDP_BE-K310_S2 → 1.Projet → 1.1 Questionnaires

Les premières versions n'étaient pas efficaces car les questions ne permettaient pas de faire remonter des informations exploitables. Ils sont un bon exemple d'un questionnaire non utilisable. Le questionnaire est envoyé à chaque fin de semaine et les résultats sont analysés le lundi matin.

c. KPIs

Les KPIs ne sont pas un moyen de tracker/ comptabiliser les résultats des projets mais d'analyser ce qui marche ou non et de réussir à identifier les problèmes pour y apporter des solutions (correctives ou préventives).

Pour l'instant les KPIs sont suivis dans Notion.



Weekly Goal :

Disponible dans l'onglet gestion de projet. Au début de la page


Coordo Multi-projet

Properties
Assigned To Domitille
Date March 22, 2026 → June 26, 2026
Time 60% | Week 8/13
15 more properties

Le BE Contacts & Equi... Wiki & Notes WebClips docs Jalons & Livrables KPI

On y suit le pourcentage des objectifs weekly atteint par chaque projet. Il est intéressant de voir avec chaque projet la raison pour laquelle les objectifs sont atteints ou non. La plupart des raisons sont dûs à des contre temps planning, des objectifs pas en accord avec le planning des équipes etc.. Il faut ensuite étudier avec les équipes comment éviter ces retards et comment anticiper. Il est intéressant de faire cette analyse le lundi lors du weekly avant de présenter les objectifs de la semaine.


1. Objectifs Hebdo par projet

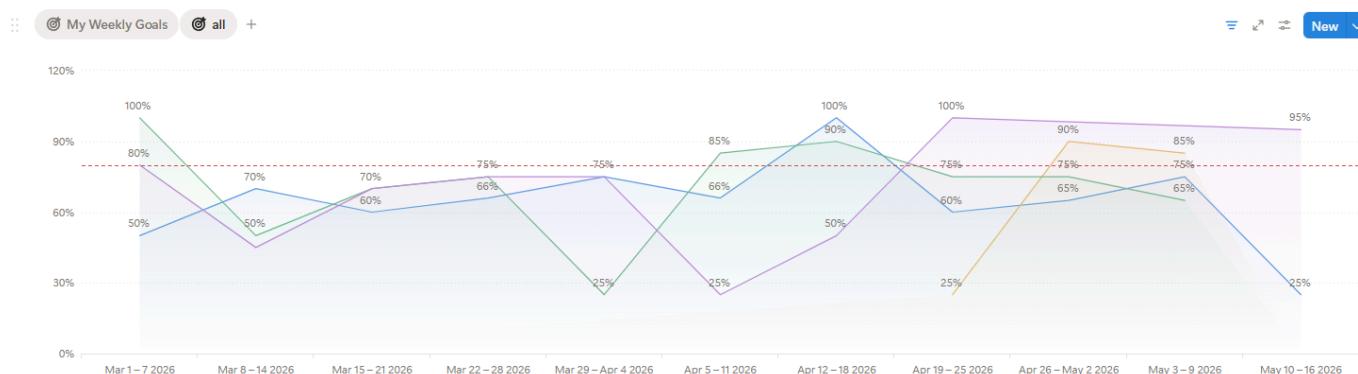

Retard Livrable :

Dans la même optique que le weekly goal. Ce Kpi suit les retards des Livrables par projet et par semaine.

2. Livrable et retard par projet

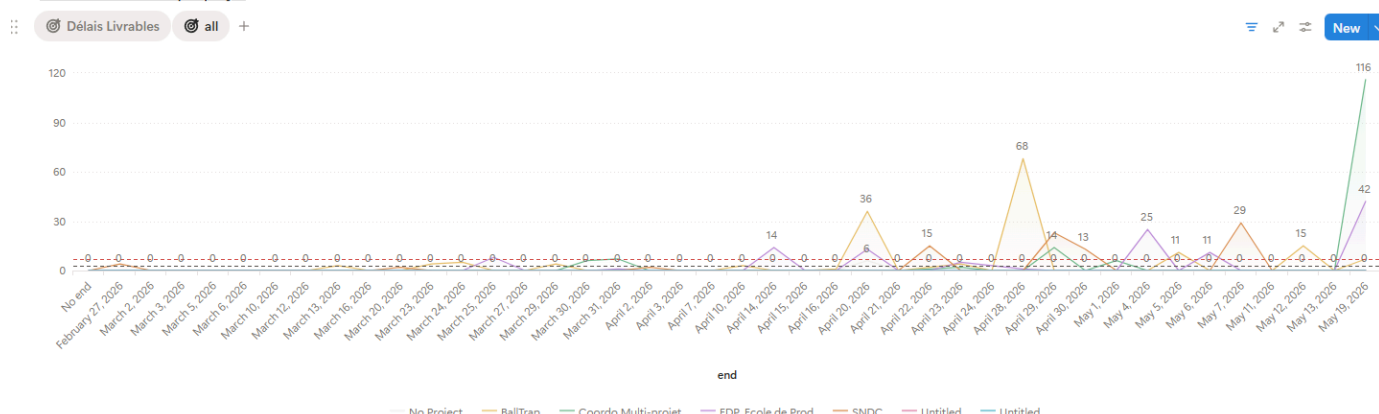

Icam, site de Toulouse 75 avenue de Grande Bretagne CS 97615 31300 Toulouse cedex 3
+33 5 34 50 50 50 icam.fr SIRET 399 252 154 000 48

d. Référentiel PSE

Ce document sert pour n'importe quel étudiants mais surtout pour les nouveaux arrivants dans un BE. Il permet de savoir qui contacter en fonction de la question; Il donne toutes les informations pour contacter les intervenants (nom, prénom, salle). Il se réintère aussi souvent que possible, en fonction des retours. Ce référentiel est disponible dans le drive 999_GDP_BE-K310_S2 → 1.Projet → 1.5 Méthodes & Outils → Référentiel PSE

e. Adoption des outils

Cet excel disponible dans 999_GDP_BE-K310_S2 → 1.Projet → 1.5 Méthodes & Outils → 260415_GDP_KPI_Adoption des outil

Il permet de tracer un graphique montrant en fonction des outils, l'adoption et la fréquence. Ces deux critères sont liés. L'adoption indique si l'outil est adopté, c'est à dire, si les étudiants comprennent l'intérêt de l'outil, qu'il leur est utile, qu'il comprenne comment s'en servir. La fréquence correspond à leur fréquence d'utilisation par jour, si ils y vont souvent et sont ou non en autonomie sur l'utilisation de l'outil.

Ces deux critères se notent sur 10 pour les outils (gantt sur notion, vue livrable sur notion, drive etc..) et il faut remplir chaque semaine l'excel pour voir l'évolution. Si un outil n'est pas adopté ou peu utilisé il faut mettre en place des actions pour permettre une adoption et une fréquence d'utilisation optimale.



3. La Méthode

a. Daily

La daily ne doit pas durer plus de 5 à 10 minutes. Tout l'intérêt de cet exercice est de le faire rapidement pour ne pas ralentir la progression des projets.

La daily sert à identifier avec les équipes les tâches de la journée, les aider à décomposer les grosses tâches, à se répartir le travail voir l'avancement dans la globalité voir si le planning est respecté et à jour. Il sert aussi à voir avec les projets si ils sont des blocages et les rediriger vers les bons intervenants.

Les dailys se font chaque jour excepté le jour de la weekly car les informations se répèteraient.

b. Weekly

La weekly sert à fixer les objectifs de la semaine de chaque projet ils doivent s'adapter à la charge de travail actuel des équipes mais aussi aux attendus du Gantt. On discute de si les objectifs de la semaine dernière sont atteints ou non et on voit ensemble les raisons. Il faut définir en amont les objectifs de la semaine pour chaque projet (idéalement le vendredi) pour ne pas perdre trop de temps quitte à modifier lors de la réunion. Tous les projets sont réunis lors de ce weekly pour permettre à chaque étudiant de savoir l'avancement de chaque projet.

